


Aufgabe zum Kalender

Erfassen Sie die nebenstehend aufgeführten Vorgänge und verknüpfen Sie diese entsprechend der Vorgabe. In der Ressourcentabelle erfassen Sie bitte diese Arbeitskräfte:

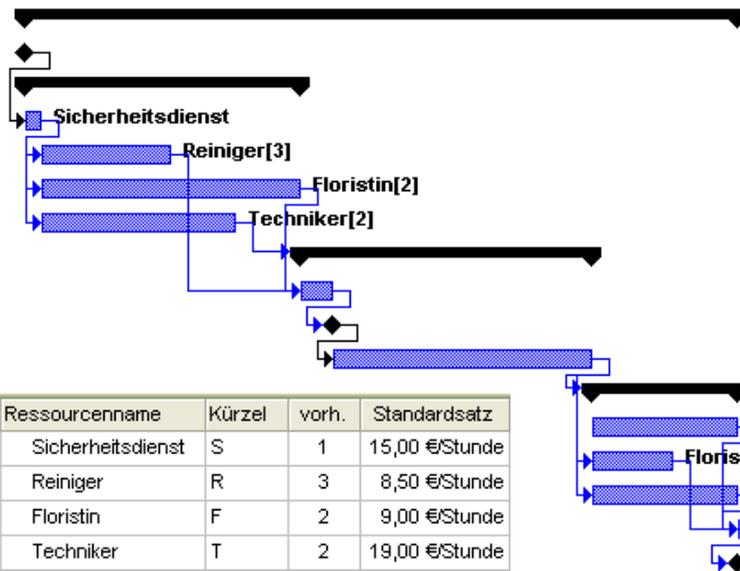

Vorgangname	Dauer
Jahrestag	11 Stunde
Projektbeginn	0 Tage
Vorbereitung	4,25 Stunde
Öffnen Räumlichkeiten	15 Min.
Reinigung der Räume	2 Stunde
Dekoration der Räume	4 Stunde
Kontrolle Technik	3 Stunde
Realisierung	4,5 Stunde
Einlaß	30 Min.
Beginn Feierstunde	0 Tage
Feierlichkeit	4 Stunde
Nachbereitung	2,25 Stunde
Reinigung	2 Stunde
Abschmücken	1 Stunde
Technik sichern	2 Stunde
Schließen	15 Min.
Projektende	0 Tage

Der Projektstarttermin ist für den 3. Oktober – dem „Tag der deutschen Einheit“ – angesetzt. Hier gelten auch außerordentliche Arbeitszeiten von 04:00-22:00 Uhr, die über den Menüpunkt **Extras/Arbeitszeit ändern** einzutragen sind. Da die Ressourcen unterschiedliche Arbeitszeiten haben, müssen Ressourcenkalender definiert werden. Definieren Sie die folgenden Zeiten für die Ressourcen:

Ressource	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis
Floristin	06:00	10:00	15:00	19:00				
Sicherheit	02:00	06:00	16:00	20:00				
Techniker	05:00	09:00	09:30	12:30	13:30	16:30	17:00	19:00
Reiniger	05:00	10:00	10:30	13:30	14:00	17:30		

Bringen Sie in Erfahrung um wie viel Uhr der Festsaal geschlossen ist, wenn die Feierlichkeiten um 10.00 Uhr beginnen.

Was kostet das Projekt?
